## **STATUSRAPPORT**



Prosjekt: Approved

Prosjektleder: Hallvard Kobbeltveit

Startdato: 09.09.16 Sluttdato: 09.12.16

### 1. HVA ER UTFØRT I PERIODEN

Frå veke 37 fram til veke 42 er følgjande gjennomført: Vi har oppretta ein ufullstendig nettside med nok back-end til å kunne skrive enkle meldingar. Meldingane har ein unik appid og ein bruker-id som gir oss eit godt oppsett. Vi har fått til eit delvis fungerande CMS med mål om å kunne registrere brukarar, ha god oversikt og redigere meldingar av applikasjonar på nettsida. Vi har med andre ord laga ei fungerande prototype.

## 2. STATUS I FORHOLD TIL MÅLOPPNÅELSE

Foreløpig ligg gruppa godt ann med arbeidet. Vi har som sagt ein prototype av plattforma som alt skal publiserast på. Meldingar av applikasjonar har det vore mindre fokus på og vil bli meir prioritert i vekene framover. Vi har fortsatt ikkje kjøpt domenet vårt, men det er satt veldig høgt på prioriteringslista. Vi er ikkje kome så langt at vi har fått til ein søke- og sorteringsfunksjon endå.

#### 3. AVVIK I FORHOLD TIL OPPRINNELIG PLAN?

Vi hadde opphavleg planlagt å ha kome i gong med meldingar av applikasjonar til no, men har erfart at det ikkje har vore nok tid til det og at vi var nøydd til å nytte ressursane våre på andre områder.

#### **Hvorfor?**

Utifrå planen skulle vi ha kome i gong med meldingar, men det har diverre ikkje vore nok tid til det. Vi valde å prioritere få ein fungerande plattform for meldingane.


#### Konsekvenser for tiltaket?

Det har blitt mindre tid til å skrive meldingar. Det vil gå utover kvaliteten/kvantiteten av meldingane når ein kjem så langt.

## 4. KORRIGERINGSTILTAK:

Hva kan gjøres/vil bli gjort for å rette opp avviket?


Omfordeling av ressursar er eit tiltak som har blitt iverksett. Grunna større utfordringar med nettsida enn først antatt har vi nedprioritert arbeidet med meldingane og heller fokusert på å få ei fungerande prototype av nettsida.

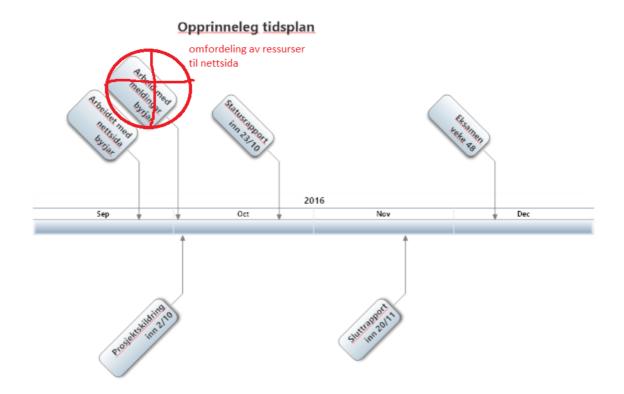

Ifølgje den nye planen skal vi bli ferdig med nettsida i løpet av nokre veker. Då tenkjer vi gradvis å omfordele ressursar til det andre delprosjektet.

#### 5. INFORMASJON:

(foredrag, media, artikler, brosjyrer, rapporter, notater m.m.)



Slik ser den foreløpige prototypen av nettsida vår ut. Kvar melding skal få ein unik ID, samstundes som ein legg inn utviklar, heimeside, plattform, etc.

#### 6. RESSURSBRUK


#### Økonomi:

Prosjekt/delprosjekt	Påløpte kostnader til nå	Budsjett for perioden
Server	0kr	100kr (50kr per mnd)
Førstegongs-oppsett	0kr	500kr
Domene	0kr	150kr

Kommentarer: Planen var å få nettsida på nett tidlegast mogleg, men vi valde å jobbe meir med den før vi gjer det. Det var ikkje så viktig å få den online så tidleg.



# **Utgifter i NOK**



## Tidsbruk: (ukesverk)

Navn	Tidsforbruk i perioden:	Planlagt tidsforbruk i perioden
Prosjektleder	15 timer	12 timer
Andre medarbeidarar	15 timer	12 timer

Som ein ser har vi faktisk brukt meir tid enn vi planla. Dette har samanheng med at vi ikkje vart ferdig med nettsida like raskt som vi trudde. Dette har som tidlegare nemnd gått utover det andre delprosjektet (meldingane til sida), samstundes som vi har sett oss nøydd til å investere meir tid i nettsida.

# 7. PLANLAGT AKTIVITET NESTE PERIODE

Ønsket resultat	Frist
FÅ INN 12 MELDINGAR PÅ NETTSIDA I FØRSTE OMGANG	15.11.16
NETTSIDAS DOMENE WWW.APPROVED.NO	28.10.16
FERDIG DATABASE, FULLSTENDIG CMS OG SØKE- OG SORTERINGSFUNKSJON	15.11.16
EIT FLOTT OG RYDDIG DESIGN MED MOGLEGHEIT Å SØKE ETTER OG SORTERE APPLIKASJONAR	15.11.16
	FÅ INN 12 MELDINGAR PÅ NETTSIDA I FØRSTE OMGANG  NETTSIDAS DOMENE WWW.APPROVED.NO  FERDIG DATABASE, FULLSTENDIG CMS OG SØKE- OG SORTERINGSFUNKSJON  EIT FLOTT OG RYDDIG DESIGN MED MOGLEGHEIT Å SØKE ETTER OG

Dato: 21.10.16 Prosjektleder Hallvard Kobbeltveit........

(Signatur)
